

新中央ふ頭 工事進捗情報



<工事内容>

西防波堤の上部コンクリートを撤去したのち、グラブ浚渫船を使用し、同船が装備する砕岩棒（30t）を一定の高さから落下させ、ケーソンに亀裂を発生させ破砕します。


破砕したケーソンコンクリート殻は、クレーン付台船を使用し運搬船へ積み込み、指定の仮置き場所まで海上運搬します。現時点で、ケーソン2函分（約20m）撤去を完了しております。

平成29年2月14日
上部コンクリート撤去工

平成29年2月27日
ケーソン撤去工

望遠撮影

望遠撮影

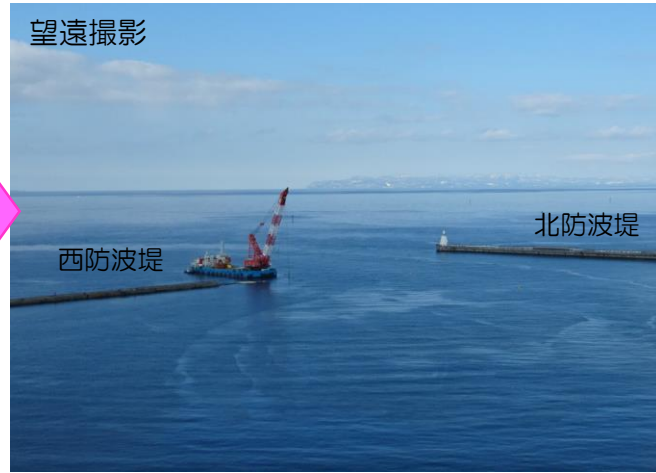

近距離撮影

近距離撮影




上部コンクリート撤去工のイメージ

クレーン付台船
(大型油圧ブレイカー)

パラペット

上部コンクリート

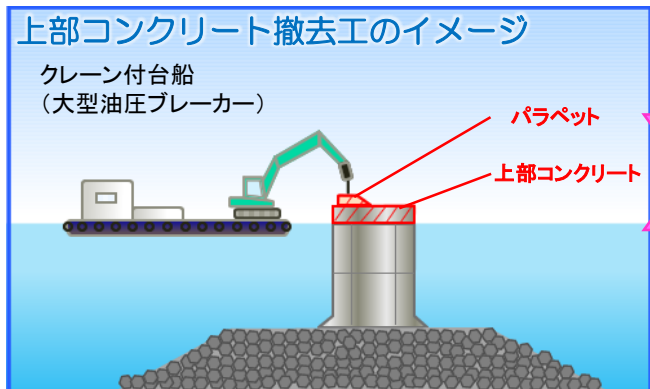

ケーソン撤去工のイメージ

グラブ浚渫船

自由落下

砕岩棒

ケーソン

