

青森港 油川地区 工事進捗状況


2025年 1 月
No.04

航空写真は令和6年10月時点のものです。

- ◆工事名 : 令和6年度青森港油川地区岸壁(-12m)仮置土砂運搬工事
- ◆施工業者 : (株)大坂組
- ◆工事期間 : 令和6年6月3日～令和6年12月27日
- ◆進捗状況 : 100% (令和6年12月末時点)

完成

- ◆工事名 : 令和6年度青森港油川地区岸壁(-12m)護岸撤去工事(その2)
- ◆施工業者 : 東亜・大本特定建設工事共同企業体
- ◆工事期間 : 令和6年10月11日～令和7年11月28日
- ◆工事内容 : 既存の裏埋土撤去を行うにあたり、異常物(不発爆弾など)がないか磁気探査を行っています。また、磁気異常点が確認された箇所の試掘を順次行っています。
- ◆進捗状況 : 4% (令和6年12月末時点)

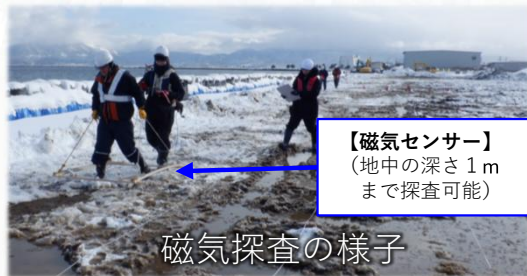

【磁気センサー】
(地中の深さ1m
まで探査可能)

磁気探査の様子



試掘の様子

- ◆工事名 : 令和6年度青森港油川地区岸壁(-12m)護岸撤去工事
- ◆施工業者 : (株)細川産業
- ◆工事期間 : 令和6年7月29日～令和7年1月31日
- ◆工事内容 : 既設護岸の上部(パラペット)を油圧式ブレーカーなどを使用し撤去しています。並行して越波対策用に、大型土のうを護岸沿いに順次設置しています。
- ◆進捗状況 : 96% (令和6年12月末時点)



パラペット撤去の様子



大型土のう設置の様子
