


青森港 油川地区 工事進捗状況

2025年3月
No.07

航空写真は令和6年10月時点のものです。

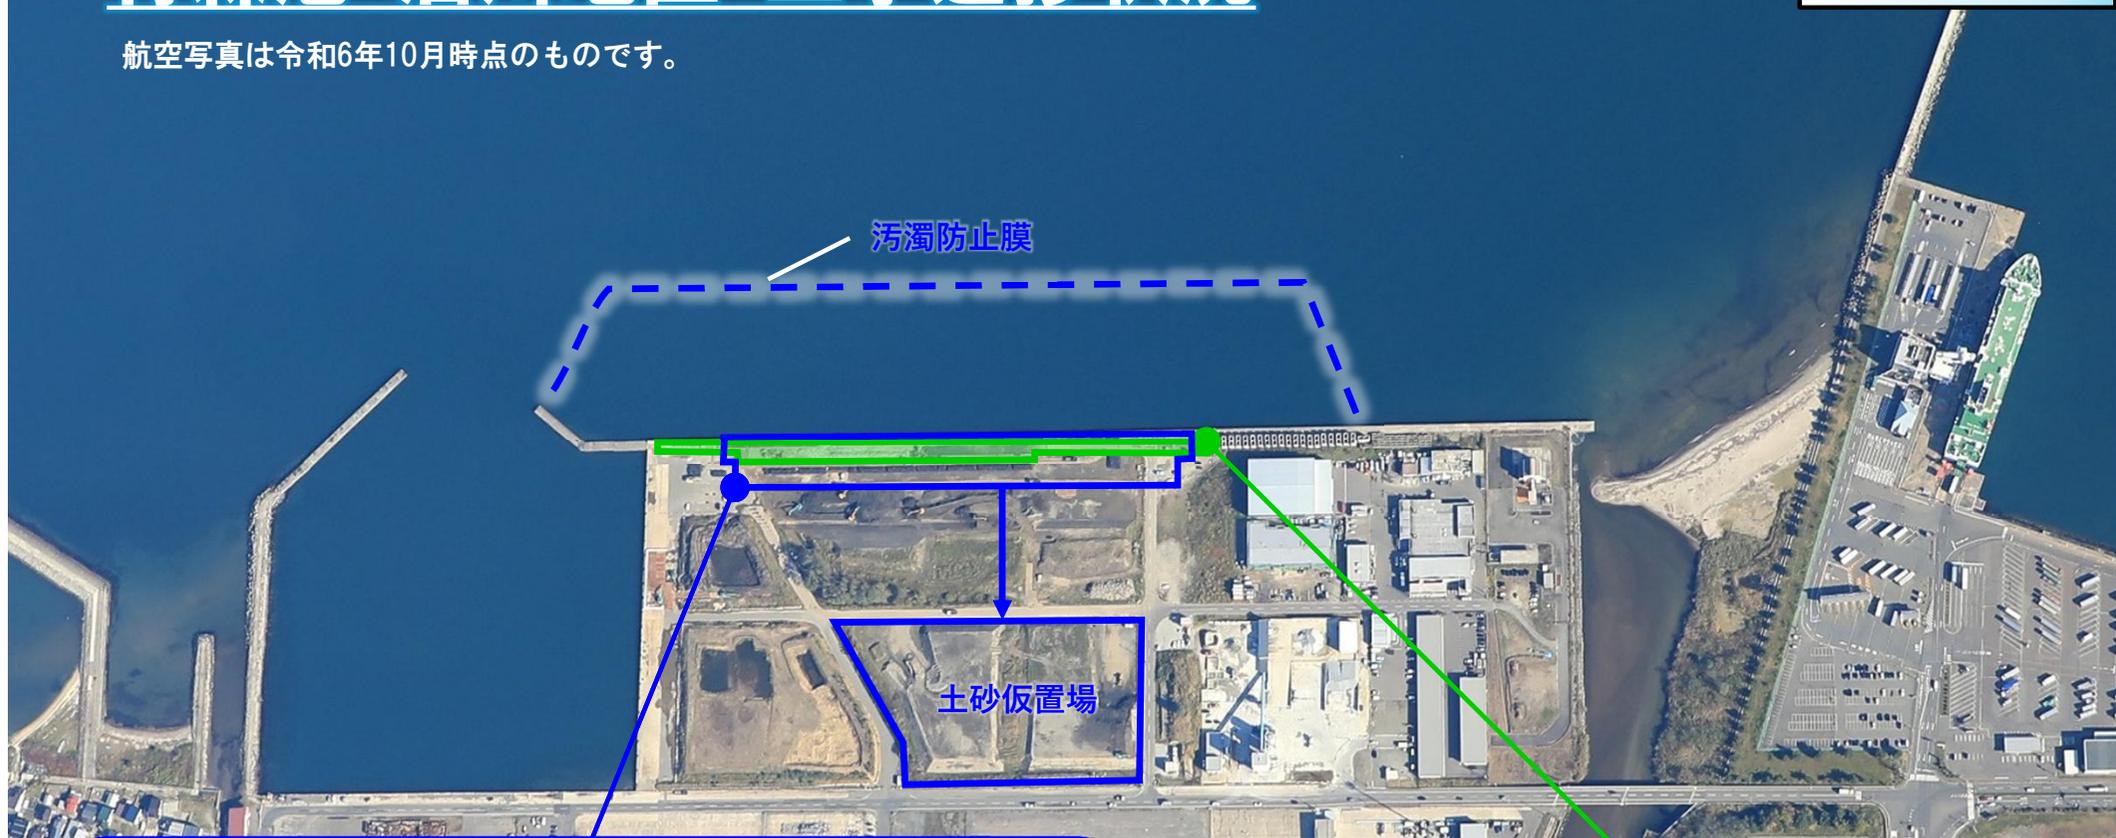

- ◆工事名 : 令和6年度青森港油川地区岸壁(-12m)護岸撤去工事(その2)
- ◆施工業者 : 東亜・大本特定建設工事共同企業体
- ◆工事期間 : 令和6年10月11日～令和7年11月28日
- ◆工事内容 : 海中への濁り拡散防止のため、護岸前面に汚濁防止膜を設置、既存の裏埋土を掘削し、背後地へ土砂を運搬しています。
- ◆進捗状況 : 12% (令和7年2月末時点)

- ◆工事名 : 令和6年度青森港油川地区岸壁(-12m)護岸撤去工事
- ◆施工業者 : (株)細川産業
- ◆工事期間 : 令和6年7月29日～令和7年1月31日
- ◆進捗状況 : 100% (令和7年2月末時点)

完成



裏埋土掘削・運搬の様子



汚濁防止膜設置の様子
