


青森港 油川地区 工事進捗状況

2025年7月
No.12

航空写真は令和6年10月時点のものです。

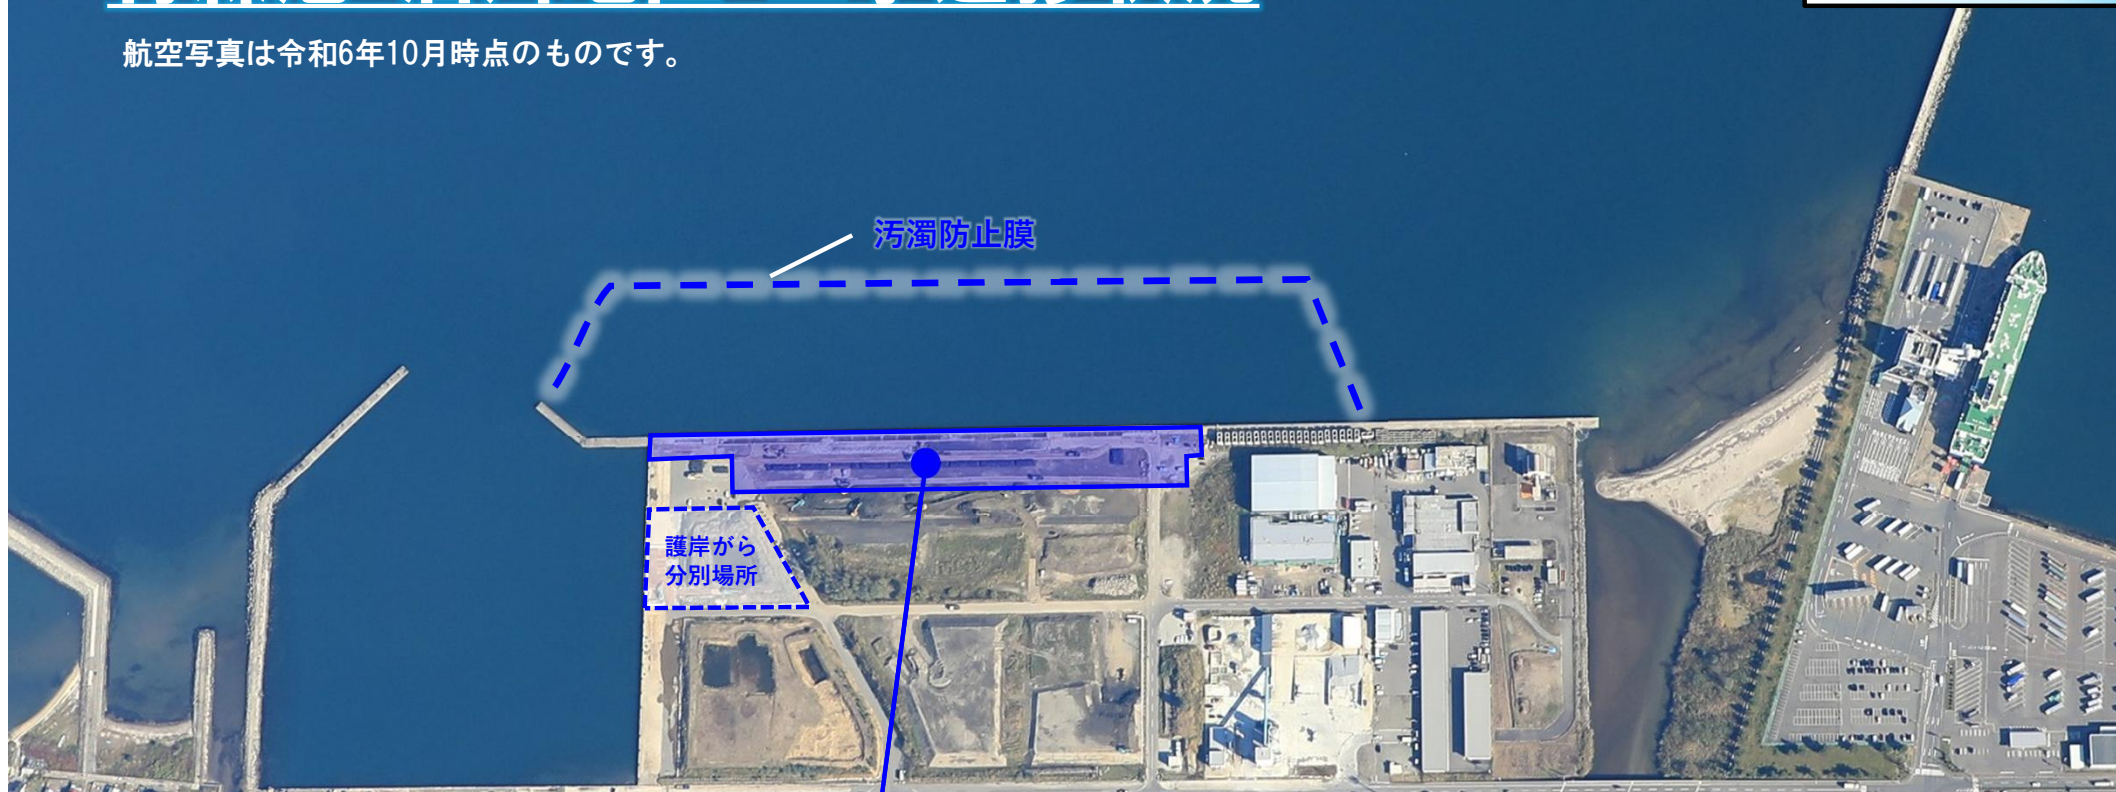

- ◆工事名 : 令和6年度青森港油川地区岸壁(-12m)護岸撤去工事(その2)
- ◆施工業者 : 東亜・大本特定建設工事共同企業体
- ◆工事期間 : 令和6年10月11日～令和7年11月28日
- ◆工事内容 : 既設護岸の破碎・撤去を実施しています。
また、破碎した護岸がらを陸揚げし、分別・搬出等を行っています。
- ◆進捗状況 : 60.8% (令和7年6月末時点)



既設護岸の破碎・撤去の様子



撤去した護岸がらの陸揚げの様子



陸揚げされた護岸がら分別の様子

