


青森港 油川地区 工事進捗状況

2026年5月
No.25

航空写真は令和8年3月時点のものです。

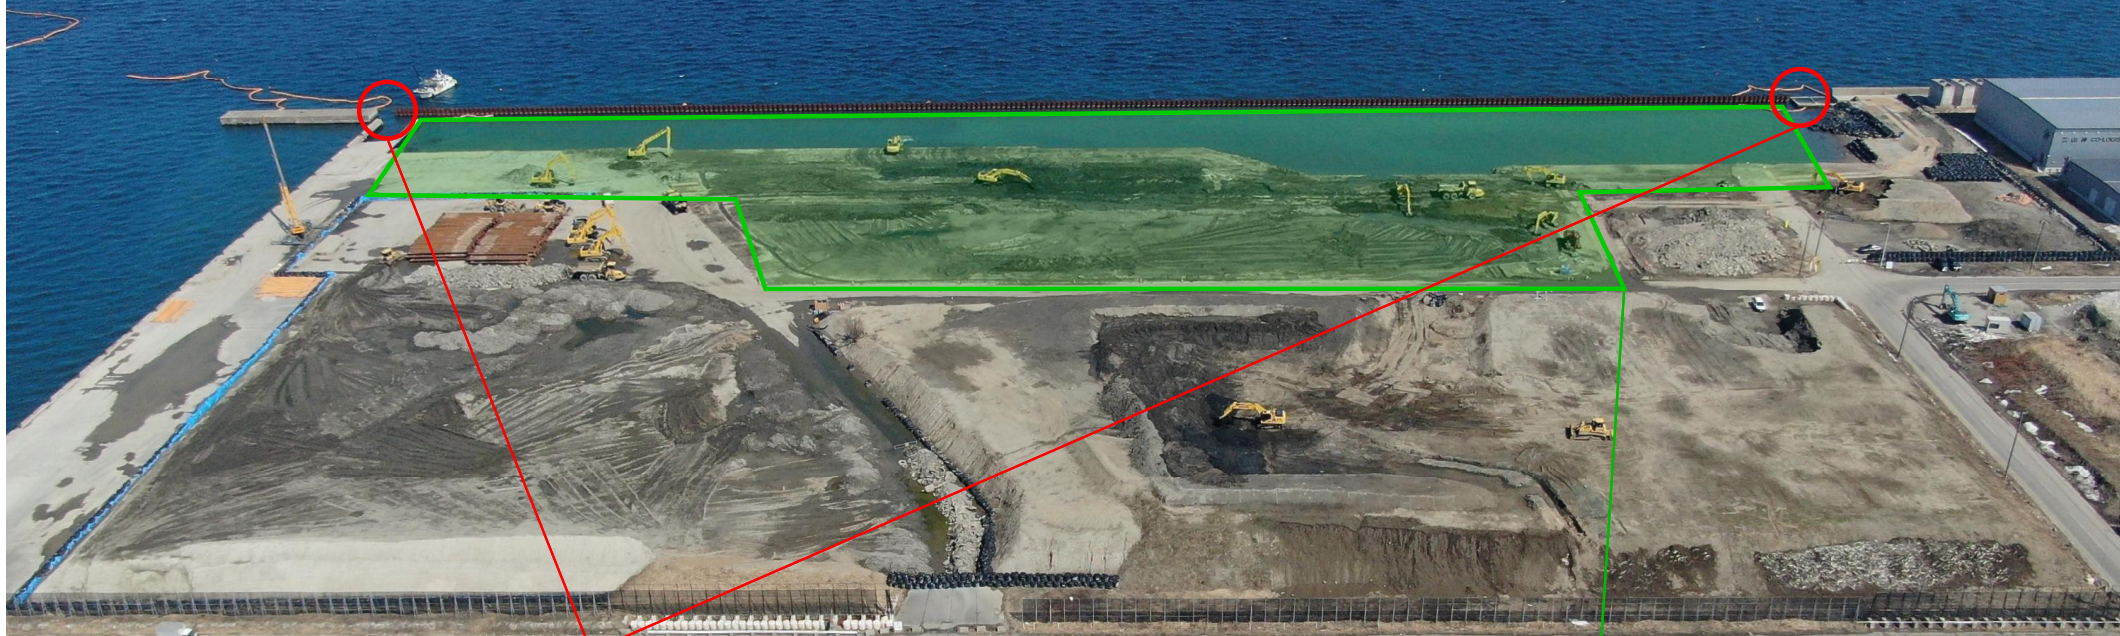

- ◆工事名 : **令和7年度青森港油川地区岸壁(-12m)本体外工事**
- ◆施工業者 : 東亜・大本特定建設工事共同企業体
- ◆工事期間 : 令和7年4月24日～令和8年5月29日
- ◆工事内容 : ◆進捗状況 : 100.0% (令和8年5月末時点)

完成



↑ 完成した間詰コンクリート ↑



- ◆工事名 : **令和7年度青森港油川地区岸壁(-12m)裏埋外工事**
- ◆施工業者 : RN建設(株) (旧りんかい日産建設(株))
- ◆工事期間 : 令和7年7月22日～令和8年7月31日
- ◆工事内容 : 裏埋土の撤去が終了し、埋戻しを行っております。
- ◆進捗状況 : 94.2% (令和8年5月末時点)



↑ 裏埋土埋戻しの様子 ↑

