

青森港 油川地区 工事進捗状況

2026年3月
No.22


航空写真は令和8年3月時点のものです。

汚濁防止膜

土砂仮置場

◆工事名 : 令和7年度青森港油川地区岸壁(-12m)本体外工事

- ◆施工業者 : 東亜・大本特定建設工事共同企業体
- ◆工事期間 : 令和7年4月24日～令和8年4月30日
- ◆工事内容 : 鋼管矢板の打設が完了し、矢板の両端部で水中コンクリートの打設を行います。
- ◆進捗状況 : 98.2% (令和8年3月末時点)

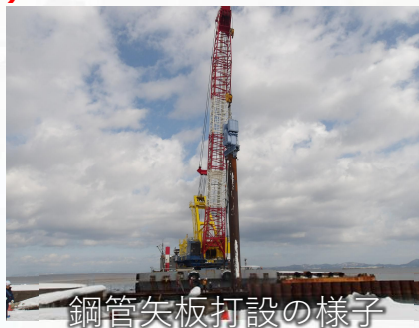

鋼管矢板打設の様子

◆工事名 : 令和7年度青森港油川地区岸壁(-12m)裏埋外工事

- ◆施工業者 : RN建設(株) (旧りんかい日産建設(株))
- ◆工事期間 : 令和7年7月22日～令和8年7月31日
- ◆工事内容 : 裏埋土の撤去及び埋戻しをしております。
- ◆進捗状況 : 61.7% (令和8年3月末時点)



裏埋土撤去の様子



裏埋土埋戻しの様子
