

# 秋田港海上工事進捗情報

(秋田港海上工事安全連絡協議会)

No.116 平成30年 5月8日発行

国土交通省 東北地方整備局 発注工事

秋田県 発注工事

進捗率は H30年4月30日現在

工事名: 秋田港外港地区防波堤(第二南)築造工事  
 施工業者: りんかい日産建設 株式会社  
 工事内容: 第二南防波堤を作っています。  
 進捗状況: 6.0%  
 工事期間: 平成 30年 3月 7日~平成 30年 11月 30日



捨石均し作業を行っています。

工事名: 秋田港外港地区防波堤(第二南)上部工事  
 施工業者: 長田建設 株式会社  
 工事内容: 第二南防波堤の上部工を作っています。  
 進捗状況: 9.2%  
 工事期間: 平成 30年 3月 15日~平成 30年 8月 30日



H鋼の建込作業を行っています。

工事名: 秋田港外港地区防波堤(南)(改良)被覆外工事  
 施工業者: 株式会社 伊藤羽州建設  
 工事内容: 被覆・消波ブロックを製作しています。  
 進捗状況: 76.0%  
 工事期間: 平成 29年 11月 28日~平成 30年 7月 10日



被覆ブロックの製作が完了しました。

工事名: 向浜ふ頭用地造成工事 29-2401-10  
 施工業者: 板橋組・秋田渥青建設特定JV  
 工事内容: 仮設ヤード造成工 基礎捨石ストックを行っています。  
 進捗状況: 34.9%  
 工事期間: 平成 29年 9月 12日~平成 30年 6月 27日



基礎捨石のストックを行っています。



工事実施箇所図

工事名: 秋田港本港地区航路泊地(埋没)浚渫工事  
 施工業者: 高橋秋和建設 株式会社  
 工事内容: 浚渫作業を行っています。  
 進捗状況: 92.0%  
 工事期間: 平成 29年 12月 5日~平成 30年 6月 15日



浚渫作業を行っています。

工事名: 向浜ふ頭用地造成工事 29-2401-20  
 施工業者: 株式会社 伊藤羽州建設  
 工事内容: 仮設ヤードの造成を行っています。  
 進捗状況: 48.0%  
 工事期間: 平成 29年 9月 12日~平成 30年 6月 27日




土砂の運搬・盛土(埋立)と、袋詰玉石の製作を行っています。

工事名: 向浜ふ頭用地造成工事 29-2401-30  
 施工業者: 三和興業 株式会社  
 工事内容: 波高計のケーブルの移設を行っています。  
 進捗状況: 16.0%  
 工事期間: 平成 29年 11月 24日~平成 30年 6月 27日



ケーブル敷設の準備作業を行っています。

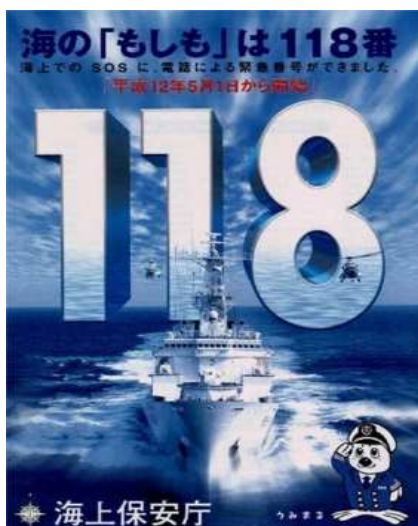

国土交通省  
 Ministry of Land, Infrastructure and Transport  
**東北地方整備局 秋田港湾事務所**  
 〒011-0945 秋田市土崎港西一丁目1番49号  
 TEL 018-847-2514 (保全課)  
**秋田県 秋田港湾事務所**  
 〒011-0945 秋田市土崎港西一丁目7番1号  
 TEL 018-845-0652

## 秋田港海上工事安全連絡協議会

お気づきの点があれば下記までご連絡下さい。  
 りんかい日産建設株式会社 秋田港作業所 TEL 018-827-5952

板橋組・秋田渥青建設特定建設工事共同企業体  
 株式会社 伊藤羽州建設  
 長田建設 株式会社  
 株式会社 伊藤羽州建設  
 株式会社 伊藤羽州建設  
 株式会社 伊藤羽州建設  
 株式会社 伊藤羽州建設
