

秋田港海上工事進捗情報

(秋田港海上工事安全連絡協議会)

No.128 令和元年5月 7日発行

国土交通省 東北地方整備局 発注工事

秋田県 発注工事

進捗率は H31年4月26日現在

工事名：秋田港飯島地区防波堤(北)(改良)
消波工事(その2)
施工業者：株式会社 沢木組
工事内容：北防波堤の消波7ロック製作及び据付を行います。
進捗状況：2.0%
工事期間：平成31年3月20日
～平成31年10月31日

準備中です。

工事名：秋田港飯島地区防波堤(北)(改良)
消波工事(その3)
施工業者：株式会社 英明工務店
工事内容：北防波堤の消波7ロックを製作しています。
進捗状況：4.2%
工事期間：平成31年3月20日
～平成31年8月9日

準備中です。

工事名：秋田港飯島地区防波堤(北)(改良)
外消波工事
施工業者：株式会社 清水組
工事内容：消波7ロックの製作を行っています。
進捗状況：64.0%
工事期間：平成30年12月19日
～平成31年7月17日




テトラポッド(64型)を製作しています。

工事名：向浜ふ頭用地造成工事
29-2401-K1
施工業者：杉本組・加藤組JV
工事内容：仮設ヤードの造成を行っています。
進捗状況：42.0%
工事期間：平成30年3月30日
～平成31年9月30日



土砂の運搬集積を行っています。

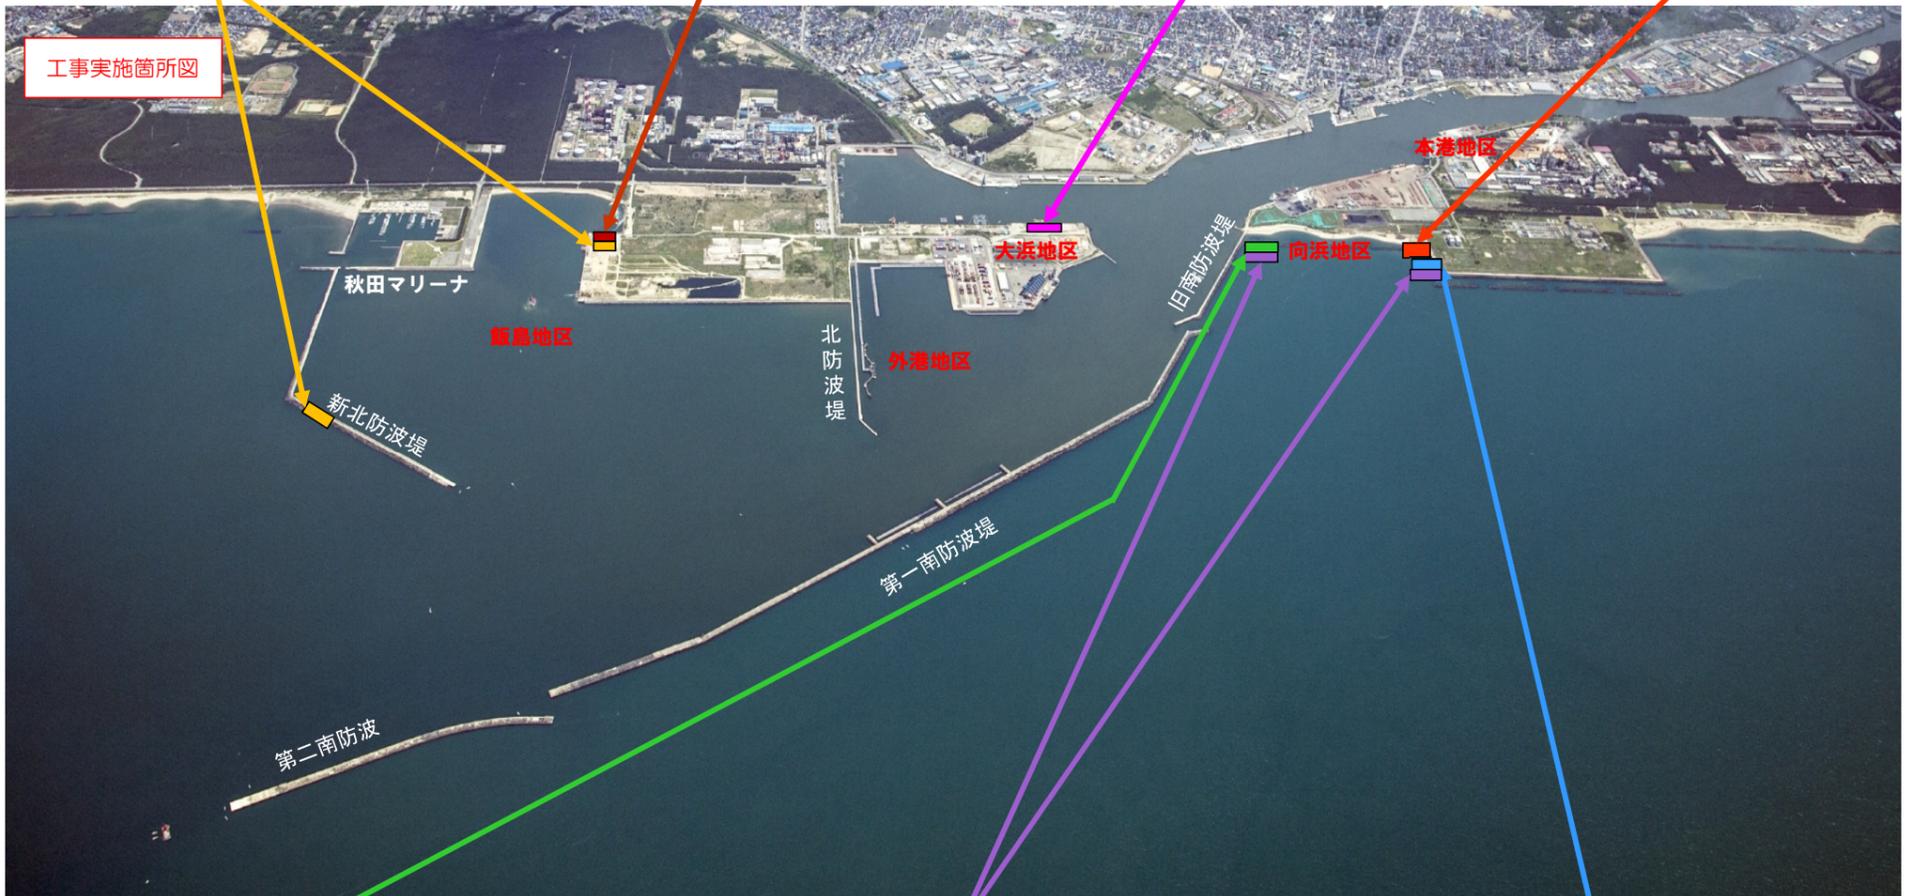

工事名：向浜ふ頭用地造成工事
29-2401-K5
施工業者：清水組・大森建設JV
工事内容：護岸の基礎を作っています。
進捗状況：57.0%
工事期間：平成30年3月30日
～平成31年9月30日



消波7ロックを撤去しています。


工事名：向浜ふ頭用地造成工事
30-2401-10
施工業者：清水組・加藤建設JV
工事内容：護岸の上部を作っています。
進捗状況：5.0%
工事期間：平成30年6月29日
～平成31年11月15日

準備中です。

工事名：向浜ふ頭用地造成工事
29-2401-K3
施工業者：加藤建設・中田建設JV
工事内容：仮設ヤードの造成を行っています。
進捗状況：54.0%
工事期間：平成30年3月30日
～平成31年9月30日



消波7ロックを設置しています。



国土交通省
Ministry of Land, Infrastructure and Transport
東北地方整備局 秋田港湾事務所
〒011-0945 秋田市土崎港西一丁目1番49号
TEL 018-847-2514 (保全課)
秋田県 秋田港湾事務所
〒011-0945 秋田市土崎港西一丁目7番1号
TEL 018-845-0652

秋田港海上工事安全連絡協議会

お気づきの点があれば下記までご連絡下さい。

株式会社 清水組 秋田港作業所 TEL 018-827-6333

株式会社 英明工務店
㈱加藤建設・中田建設(株)JV
株式会社 清水組
株式会社 沢木組

㈱清水組・大森建設(株)JV
㈱杉本組・㈱加藤組JV
㈱清水組・㈱加藤建設JV
