

○主要港湾施設の復旧状況（6月30日時点）

対象施設	現在の進捗率	復旧完了時期
八太郎地区1号埠頭E岸壁（国施工）	7月頃着手 予定	令和8年秋頃 予定
八太郎地区1号埠頭E岸壁（青森県施工）	7月頃着手 予定	令和8年秋頃 予定

○施工箇所



○応急復旧完了時の状況（国施工箇所）



R7.12.20応急復旧完了

本復旧工事を7月頃より着手予定
（実施内容）


- ・既設舗装版の撤去
- ・アスファルト舗装
- ・吸出防止対策工




○主要港湾施設の復旧状況（6月30日時点）

対象施設	現在の進捗率	復旧完了時期
八太郎地区4号埠頭P岸壁（国施工）	8月頃着手 予定	令和8年秋頃 予定
八太郎地区4号埠頭P岸壁（青森県施工）	8月頃着手 予定	令和8年秋頃 予定

○施工箇所

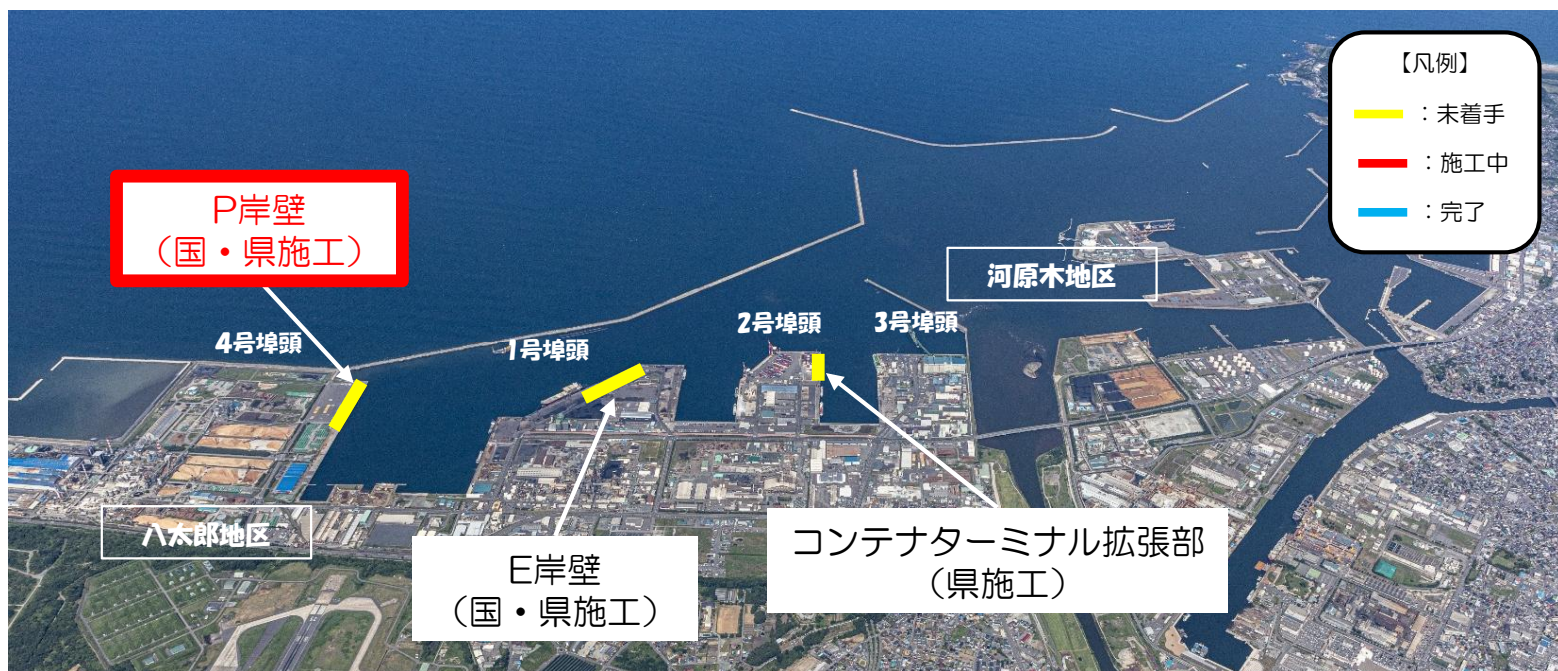

○応急復旧完了時の状況（国施工箇所）

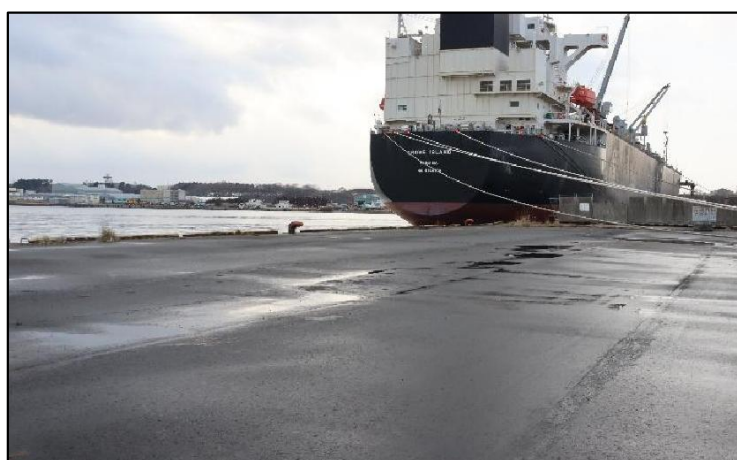

R8.1.15応急復旧完了

本復旧工事を8月頃より着手予定
（実施内容）

- ・既設舗装版の撤去
- ・アスファルト舗装

