

令和7年12月8日発生 青森県東方沖地震 八戸港の災害復旧状況について

○主要港湾施設の復旧状況（7月31日時点）

対象施設	現在の進捗率	復旧完了時期
八太郎地区1号埠頭E岸壁（国施工）	68.5%	令和8年秋頃 予定
八太郎地区1号埠頭E岸壁（青森県施工）	8月頃着手 予定	令和8年秋頃 予定

○施工箇所



○本復旧工事の状況（国施工箇所）



（実施内容）

- ・既設舗装版撤去（完了）
- ・路盤材敷き均し（完了）
- ・新設アスファルト舗装（施工中）

※吸出防止対策工については、
現地調査に向けた準備を行っております。

R8.7.17 路盤材敷き均し状況

その他の港湾施設の復旧状況は青森県庁ホームページに掲載しています。
[令和7年12月8日青森県東方沖地震からの港湾復旧について - 青森県庁ホームページ](https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/ha-kokan/RO7_saigai.html)

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/ha-kokan/RO7_saigai.html




QRコードからも
ご覧いただけます

令和7年12月8日発生 青森県東方沖地震 八戸港の災害復旧状況について

○主要港湾施設の復旧状況（7月31日時点）

対象施設	現在の進捗率	復旧完了時期
八太郎地区4号埠頭P岸壁（国施工）	26.2%	令和8年秋頃 予定
八太郎地区4号埠頭P岸壁（青森県施工）	9月頃着手 予定	令和8年秋頃 予定

○施工箇所

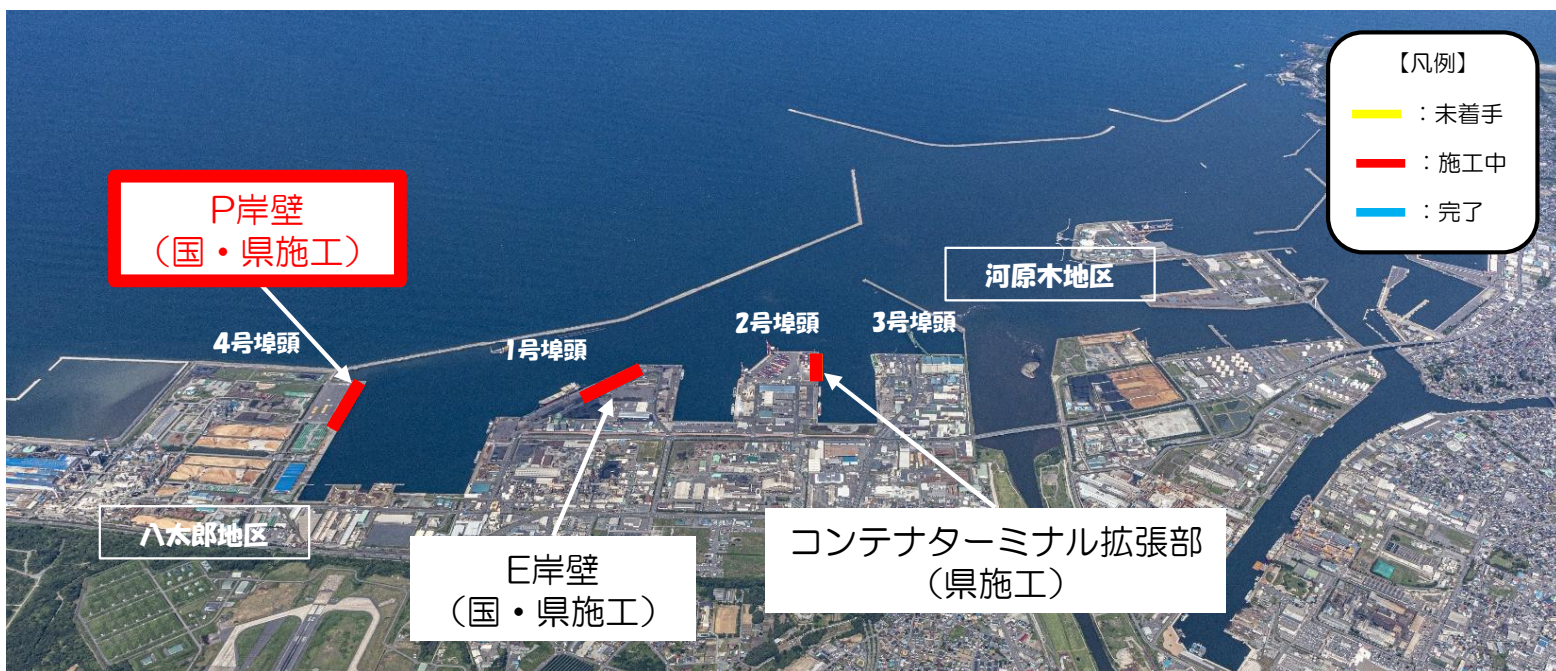

○本復旧工事の状況（国施工箇所）



R8.7.7 既設舗装版切断状況

（実施内容）

- ・既設舗装版切断（完了）

※八太郎地区1号埠頭E岸壁を優先して
施工を進めており、本格的な復旧工事は
お盆明けを予定しております。

その他の港湾施設の復旧状況は青森県庁ホームページに掲載しています。
[令和7年12月8日青森県東方沖地震からの港湾復旧について - 青森県庁ホームページ](https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/ha-kokan/RO7_saigai.html)

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/ha-kokan/RO7_saigai.html



QRコードからも
ご覧いただけます
