

令和7年12月8日発生 青森県東方沖地震 八戸港の災害復旧状況について

○主要港湾施設の復旧状況（9月30日時点）

対象施設	現在の進捗率	復旧完了時期
八太郎地区1号埠頭E岸壁（国施工）	88.0%	令和8年秋頃 予定
八太郎地区1号埠頭E岸壁（青森県施工）	70.0%	令和8年10月末頃 予定

○施工箇所



○本復旧工事の状況（国施工箇所）



R8.9.8 吸出防止対策工に係る現地調査状況

（実施内容）

- ・吸出防止対策工の施工に向けた現地調査

※現在、現地調査の結果を基に施工に向けた各種検討、材料調達を進めております。

その他の港湾施設の復旧状況は青森県庁ホームページに掲載しています。
[令和7年12月8日青森県東方沖地震からの港湾復旧について - 青森県庁ホームページ](https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/ha-kokan/R07_saigai.html)

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/ha-kokan/R07_saigai.html




QRコードからも
ご覧いただけます

令和7年12月8日発生 青森県東方沖地震 八戸港の災害復旧状況について

○主要港湾施設の復旧状況（9月30日時点）

対象施設	現在の進捗率	復旧完了時期
八太郎地区4号埠頭P岸壁（国施工）	46.7%	令和8年秋頃 予定
八太郎地区4号埠頭P岸壁（青森県施工）	10.0%	令和8年秋頃 予定

○施工箇所

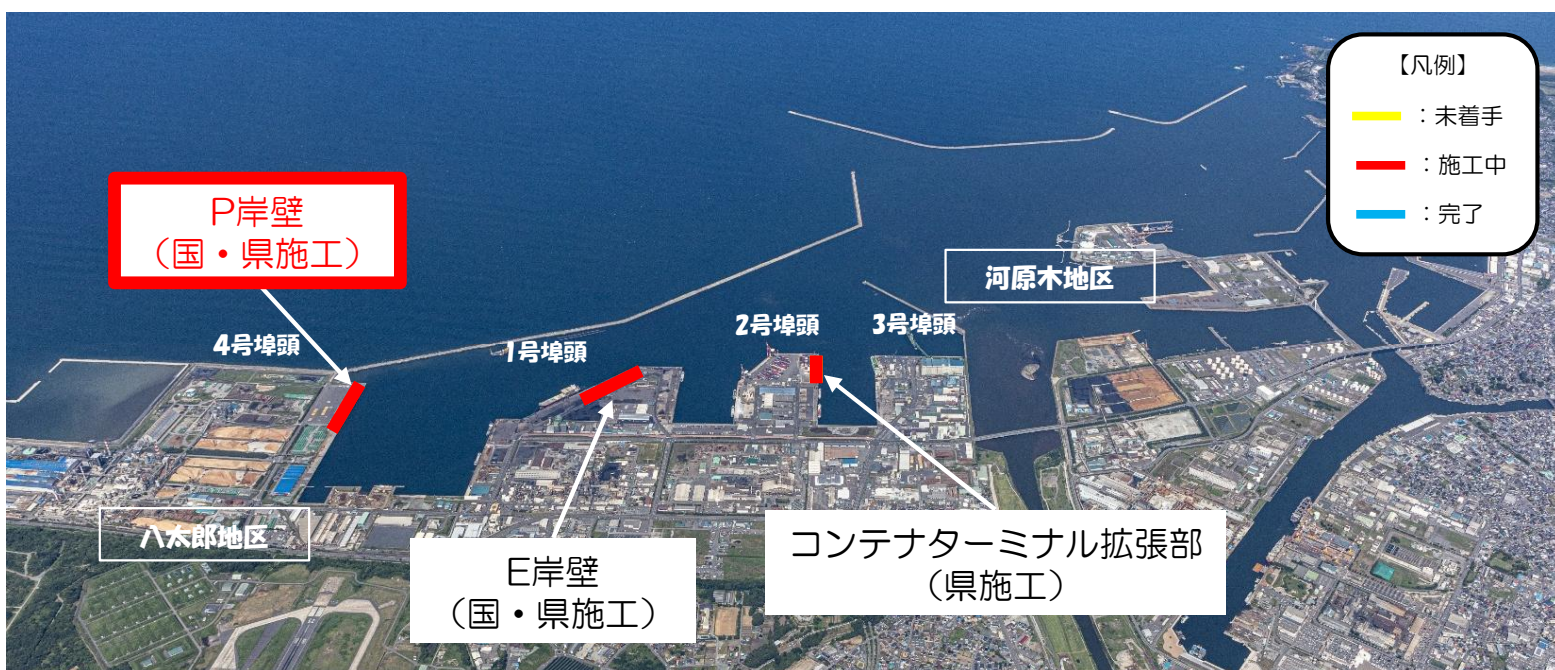

○本復旧工事の状況（国施工箇所）



① R8.9.17 新設アスファルト舗装 施工完了状況



② R8.9.24 既設舗装版撤去状況

（実施内容）①新設アスファルト舗装（3ブロックのうち1ブロック目完了）

②既設舗装版撤去（3ブロックのうち2ブロック目完了）

※港湾利用者との調整の結果、施工範囲を3ブロックに分けて施工しております。

その他の港湾施設の復旧状況は青森県庁ホームページに掲載しています。

令和7年12月8日青森県東方沖地震からの港湾復旧について - 青森県庁ホームページ

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/ha-kokan/RO7_saigai.html



QRコードからも
ご覧いただけます
