


大震災後、被災港湾で初のケーソン据付開始 ～4月6日（金）より北防波堤(中央部)ケーソンの据付を開始します～

平成23年3月11日に発生した東日本大震災により、八太郎北防波堤が甚大な被害を受けました。

太平洋沿岸の諸港で、甚大な被害を受けた防波堤に先んじて、4月6日から本格復旧の開始となる北防波堤（中央部）ケーソンの据付を開始します。

【ケーソン据付状況図】

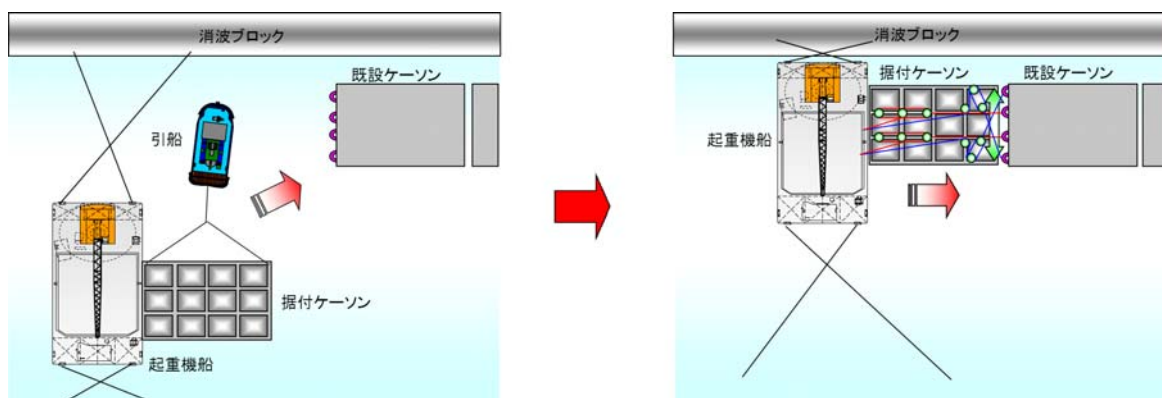

八太郎北防波堤(災害復旧)ケーソン1号函据付の概要は下記のとおりです。

記

- 作業開始日：平成24年4月6日（金）

| | |
|-----------|-----------|
| ケーソン仮置場出航 | 6：00 |
| 北防波堤到着 | 7：00 |
| ケーソン据付 | 7：00～9：00 |

※当日の気象海象状況により作業中止の場合があります。

- 施工場所：八戸港八太郎地区八太郎北防波堤(中央部)（別添函参照）

【問い合わせ先】 国土交通省 東北地方整備局 八戸港湾・空港整備事務所

電話 0178(22)9391

副所長 原田 久志

電話 0178(43)8135

専門官 吉田 靖

ケーソン据付位置図



ケーソン据付サイクルタイム

| 工種 | 場所 | 所要 予定時間 | 4/5(木) | | | | | 4/6(金) | | | | | 4/7(土) | | | | | 備考 | | |
|---------------|--------------|--------------|--------|---|----|----|----|--------|---|----|----|----|--------|---|----|----|----|----|----|---|
| | | | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | | 24 | |
| 準備 | 東防波堤仮置場 | 4.0時間 | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| ケーソン浮上 | 東防波堤仮置場 | 3.0時間 | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| ワイヤリング | 北防波堤 | 1.0時間 | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | |
| ケーソン曳航 | ケーソン仮置場～北防波堤 | 1.0時間 | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | |
| ケーソン据付 | 北防波堤 | 2.0時間 | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| 根固ブロック据付 | 北防波堤 | 1.0時間 | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | |
| 中詰材投入 | 北防波堤 | 7.0時間 | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| 排水 | 北防波堤 | 1.0時間 | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | |
| きめ砂 | 北防波堤 | 1.0時間 | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | |
| 中詰天端均し | 北防波堤 | 3.0時間 | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | |
| 蓋コンクリート打設 | 北防波堤 | 4.0時間 | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ |
