令和7年12月8日発生 青森県東方沖地震
八戸港の災害復旧状況について

国土交通省 東北地方整備局
八戸港湾・空港整備事務所

青森県 県土整備部 Land and Infrastructure Dept. Aomori Prefectural Government
三八県土整備事務所
八戸港管理所

○主要港湾施設の復旧状況（10月30日時点）

対象施設	現在の進捗率	復旧完了時期
八太郎地区１号埠頭E岸壁（国施工）	92.0%	令和８年秋頃 予定
八太郎地区１号埠頭E岸壁（青森県施工）	100.0%	令和８年１０月２９日

○施工箇所



○本復旧工事の状況（国施工箇所）



R8.9.8 吸出防止対策工に係る現地調査状況

（実施内容）
- 吸出防止対策工用の資材製作中

※資材製作が完了次第、現地施工を進めてまいります。

その他の港湾施設の復旧状況は青森県庁ホームページに掲載しています。
令和7年12月8日青森県東方沖地震からの港湾復旧について - 青森県庁ホームページ
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/ha-kokan/R07_saigai.html

QRコードからもご覧いただけます

令和7年12月8日発生 青森県東方沖地震
八戸港の災害復旧状況について


国土交通省 東北地方整備局
八戸港湾・空港整備事務所

青森県 県土整備部 Land and Infrastructure Dept. Aomori Prefectural Government
三八県土整備事務所
八戸港管理所

○主要港湾施設の復旧状況（10月30日時点）

対象施設	現在の進捗率	復旧完了時期
八太郎地区４号埠頭P岸壁（国施工）	72.1%	令和８年秋頃 予定
八太郎地区４号埠頭P岸壁（青森県施工）	40.0%	令和９年３月 予定

○施工箇所

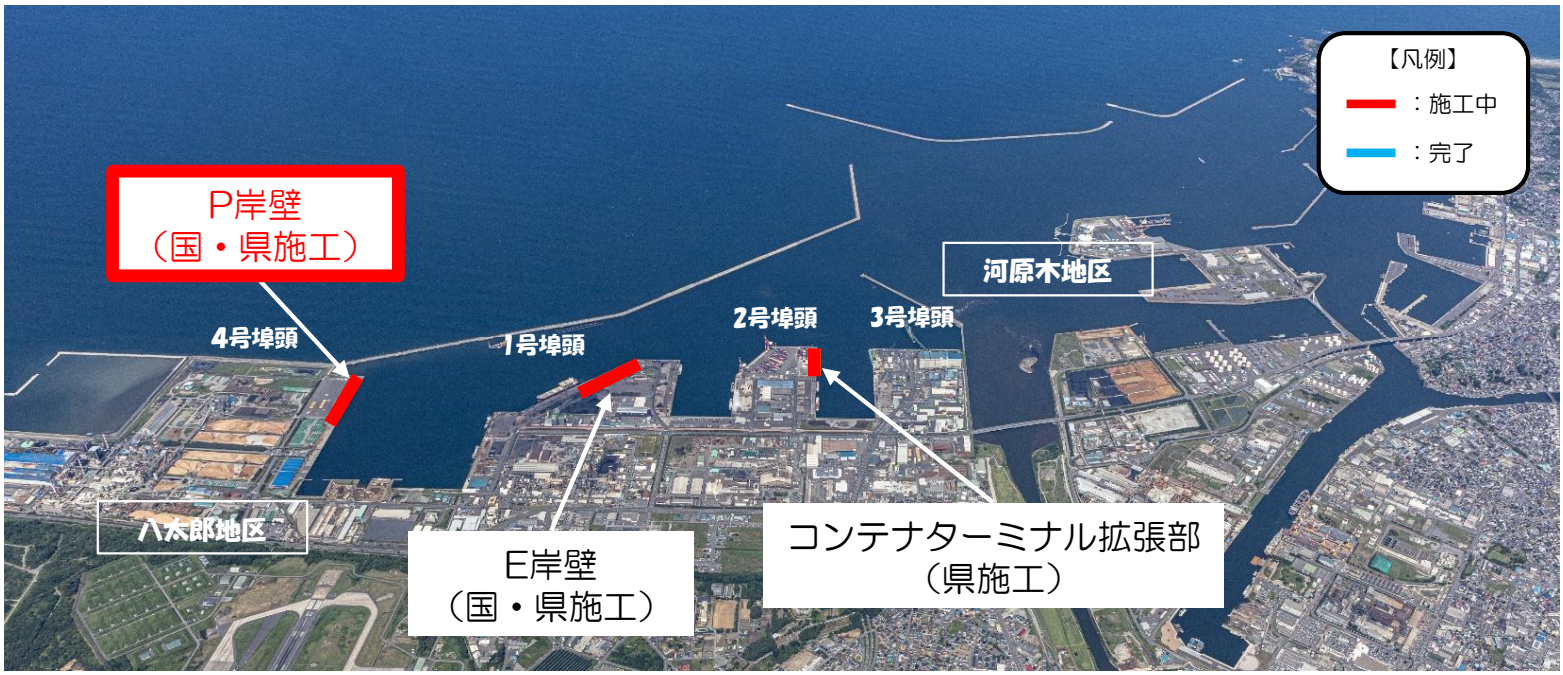

○本復旧工事の状況（国施工箇所）



① R8.10.16　新設アスファルト舗装 施工完了状況



② R8.10.21 既設舗装版撤去状況

（実施内容）①新設アスファルト舗装（3ブロックのうち2ブロック目まで完了）
②既設舗装版撤去（3ブロックのうち３ブロック目施工中）
※港湾利用者との調整の結果、施工範囲を3ブロックに分けて施工しております。

その他の港湾施設の復旧状況は青森県庁ホームページに掲載しています。
令和7年12月8日青森県東方沖地震からの港湾復旧について - 青森県庁ホームページ
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/ha-kokan/R07_saigai.html

QRコードからも
ご覧いただけます
